

令和2年も、残すところ約1カ月となりました。工事は、躯体工事、仕上げ工事、外構工事などを各階各所にて同時進行で働めている状況です。

躯体工事は、屋上部分を施工中で、12月中旬に完了する予定です。内装工事は5階に着手し、外装仕上げは5階の施工中です。


11月の初旬に、市役所通りに面する建物南側低層部分の外部足場を解体しました。安全ネット越しですが、最終仕上げの装いがご覧いただけます。

竣工引渡しまで約4カ月余りとなりました。引き続き、新型コロナ感染、現場の安全に留意して工事を進めてまいります。




■ 工事進捗状況(全景)

市役所通りから見た全景写真です。南東面低層階の市民活動室・市民サロン部にある曲線部分の外装はタイル張り・アルミサッシ・塗装仕上げとなります。その手前に設ける外構部分は、桜を植える植栽エリアとなります。

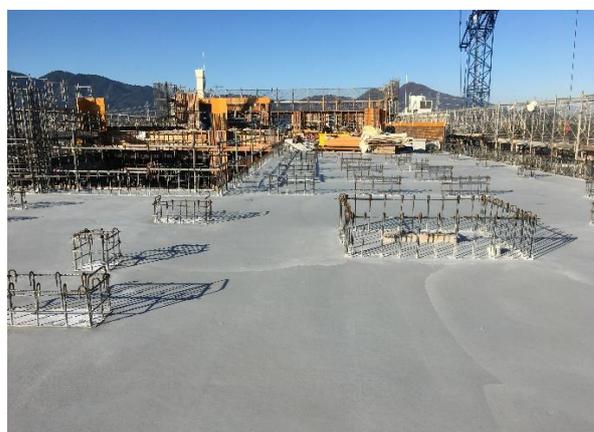

■ 屋上躯体工事状況

屋上躯体工事の状況です。設備機械基礎を含めた本棟の躯体工事は、12月末までに、全て完了します。

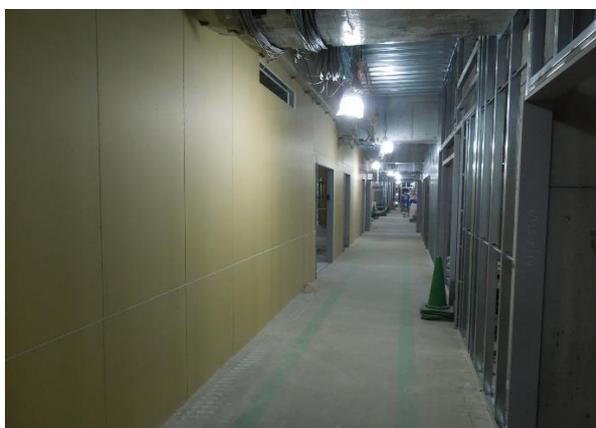

■ 4階内部仕上げ状況

4階(廊下)の内装工事の状況です。写真右側にみられるように、軽量鉄骨下地を組み立てた後に、壁ボード張りを行っています(写真左側)。壁ボード張り完了後、天井工事を行います。(※照明は仮設です。)



■ 1階内部仕上げ状況

1階(執務スペース)の内装工事の状況です。ここでは、天井ボード張りが完了し、照明器具、空調機カバーを取付けています。12月には床OAフロアに着手します。(※照明は仮設です。)

